


Logg i utplassering.

Logg dag 1.


I dag startet vi dagen med å dra ned til . og ble møtt med masse kø. Når vi kom fram så skulle vi skjøte en 150 kvadrat kabel opp under taket, det var ikke så lett, men det gikk. Etter det gikk opp en etasje i bygningen, der skulle vi sette opp varme tilfelle det frøys. Så vår oppgave var og fikse et gammelt varmeanlegg, så vi møte feilsøke oppe langs taket med lift, og det var høyt. Etter dette var dagen slutt og vi havnet i kø hele veien hjem.

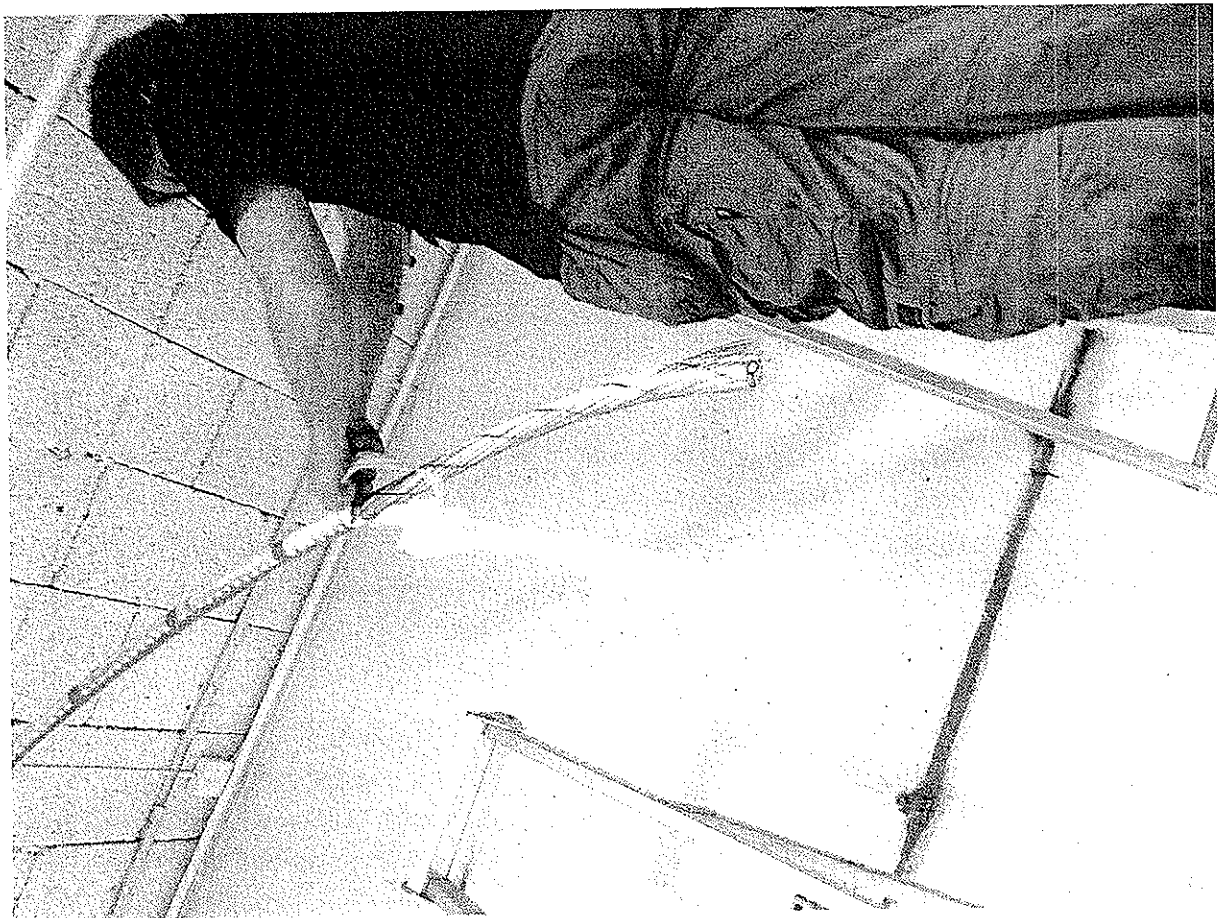

Logg dag 2.

I dag startet vi dagen med og dra hjem til noen på . og sette opp 11 stikk, 5 brytere og 4 lampepunkt. I dag fikk jeg lov og være med og jobbe, jeg koblet alle stikkontaktene og koblet en bryter, dette anlegget var skjult. Etter dette tok vi lunsj, etter vi var ferdig med lunsjen dro vi til en gammel mann på . der en ledning som hang over gårdsplassen hadde falt av kroken, vi satt opp en ny krok og dro videre. Etter dette dro vi til en litt tøff type, et Hells Angels medlem :O var nesten

sikker på at jeg skulle få juling, men alt gikk heldigvis bra. På slutten av dagen bestilte vi utstyr til en jobb vi hadde planlagt tidligere på dagen, etter dette var dagen over.

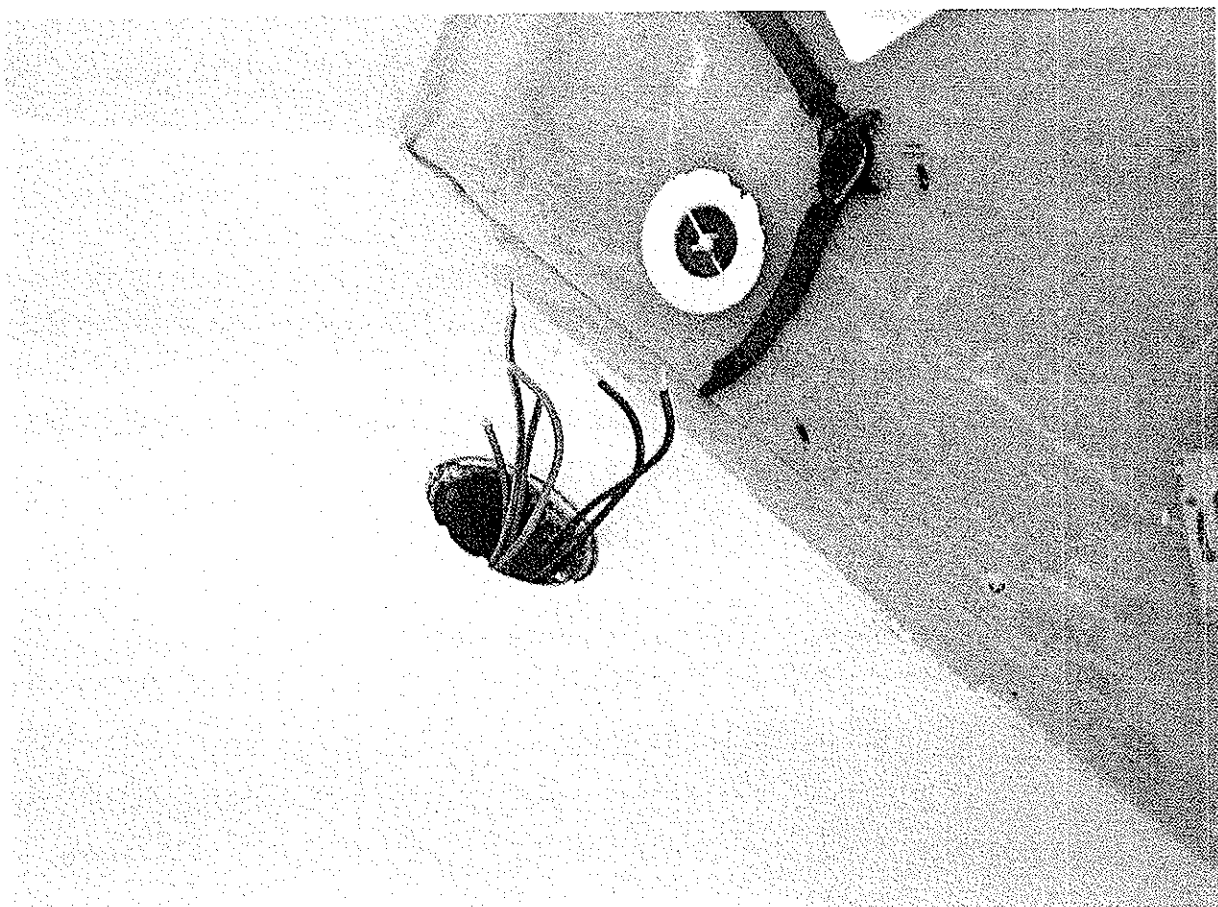


Logg dag 3.

I dag så var starten på dagen litt veldig slapp, montøren jeg var med hadde glemt og bestilt den kablen vi skulle ha, så vi måtte på solar og bestille. Dette tok sin tid, så vi måtte slå i hjel litt tid og satte oss ned og spilte på telefonene våre. Etter vi hadde fått den 100m kablen trommelen vi skulle ha, dro vi til et parkeringshus i . Der skulle vi dra hundre meter med kabel, sette opp en ny kurs og sette inn en 32 A sikring, alt dette for EN stikkontakt. Etter vi hadde dratt kablen og bårre alle hølene vi skulle ha, for kablen skulle opp 4 Etasjer, så måtte vi sette inn den nye sikringen, MED strøm. Dette var et TN 400volts anlegg, og vi kunne ikke ta strømmen for da hadde veldig mange pcer som var i det store bygget blitt svart. Etter vi var ferdig med dette, så dro vi til en kunde på , han skjønte ikke hvorfor sikringen hans gikk hele tiden, han hadde en 10 A sikring på skapet, og i toppen så målte vi 17A på sikringen når han satte på ting han brukte daglig samtidig. Vi skiftet ut sikringen med en med høyere A, og bestemte at han ville ha et nytt sikringsskap med automat sikringer og sette opp en egen kurs for kjøkkenet, etter dette var dagen ferdig.




Logg dag 4.

I dag så satt jeg utafor kontoret og ventet på og få vite hvem montør jeg skulle være med ut, så gikk de fleste montørene ut, og jeg satt der, etter en halvtime så skulle sjefen skrive ut et papir, og så meg. Han hadde glemt meg, så han kjørte meg til nærmeste montør som var på. der var det et kontor som skulle bygges, og der skulle lys, brytere og internett uttak være overalt, og alt skulle være skjult. Så vi dro mye rør og kabel, etter hvert så koblet jeg CAT kablene inn i uttakene på alle rom. På slutten av dagen ble det mye rydding, men det ble bra til slutt. Jeg håper jeg får hvert med tilbake dit i morgen, syntes jeg lærte ganske mye i dag.

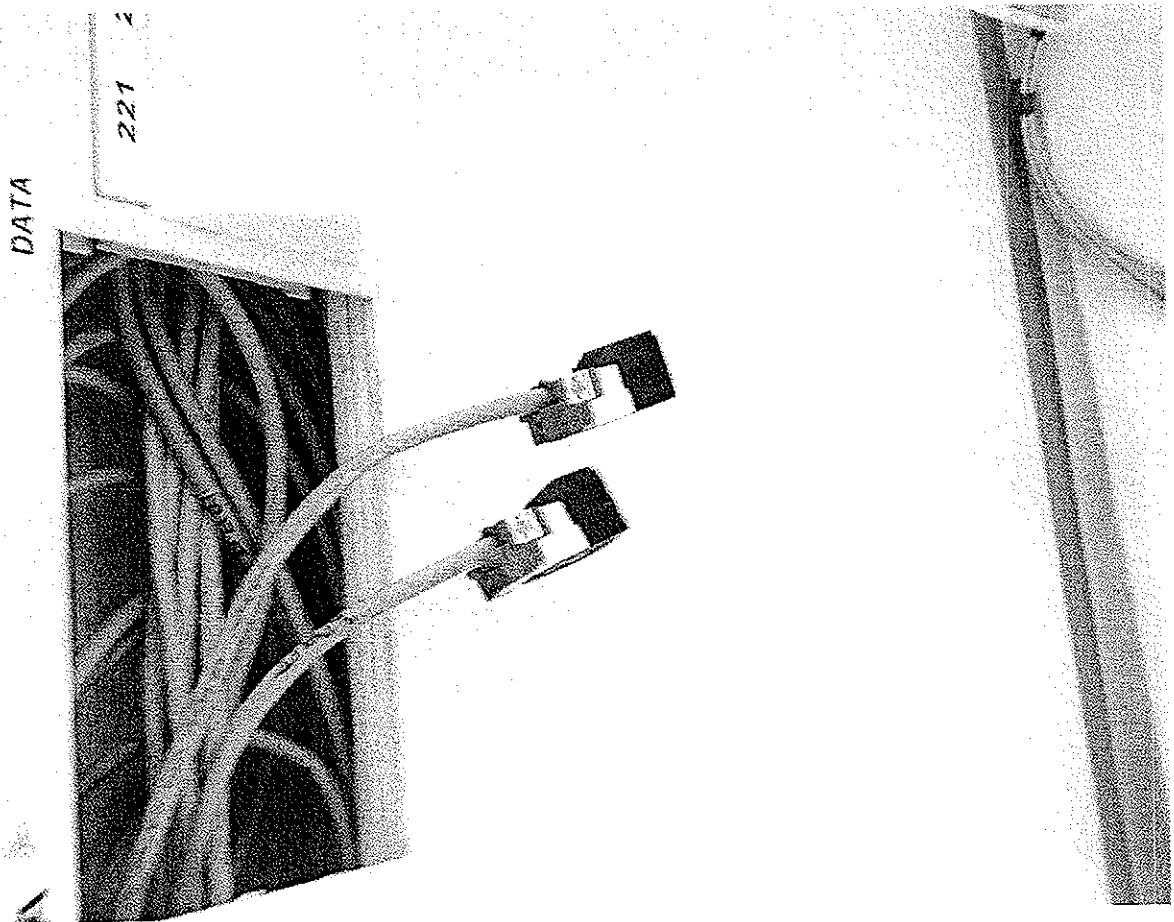

Dag 5

Idag så var vi tilbake på _____ som ligger ved stasjonen på jessheim. Der var det noen cat 5 kabler som jeg skjøttet sammen. det var alt vi gjorde den dagen, jeg fikk gå 11, fordi montøren jeg var med skulle til tannlegen.

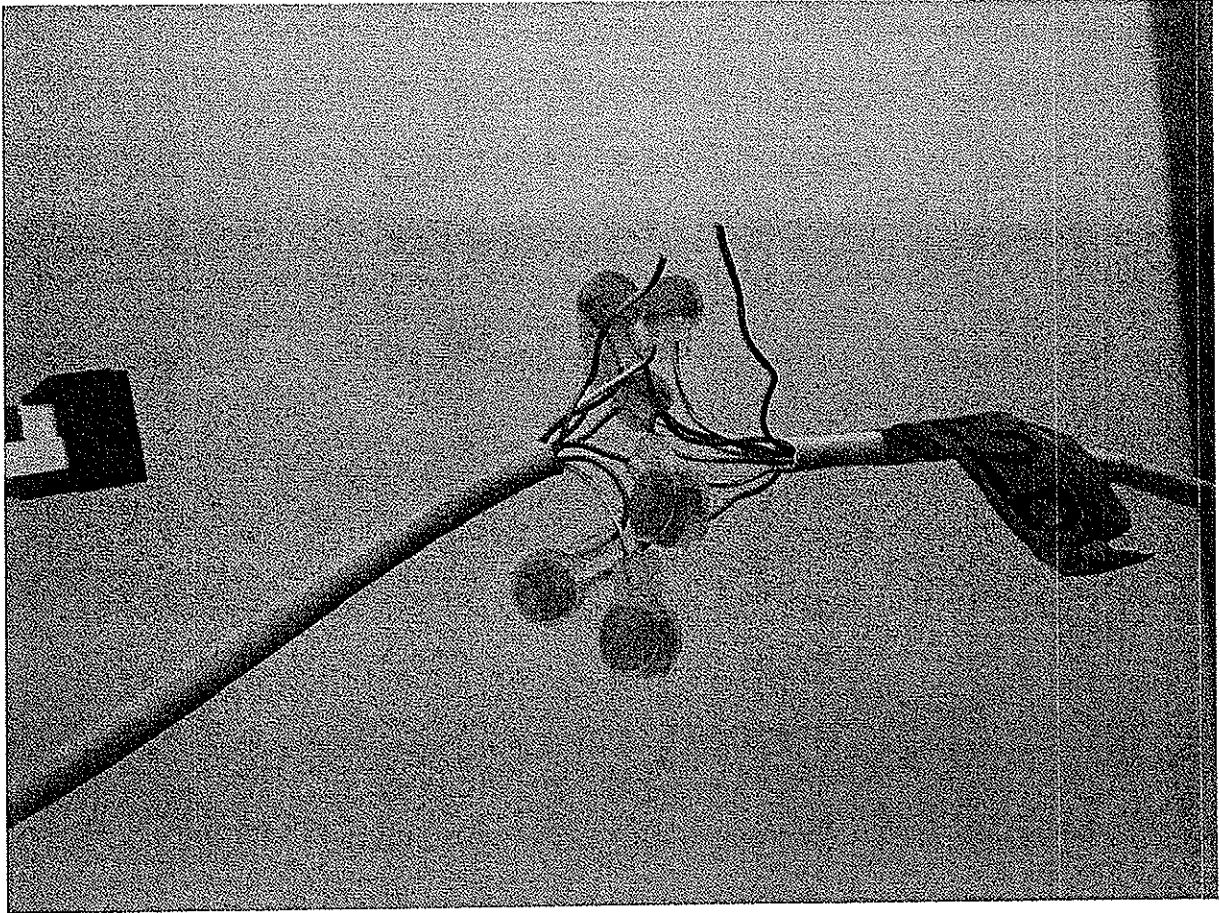


Dag 6

Mandag.. ja, idag så var det tilbake på en tur og dra kabler til noen nye kurser vi skulle sette opp. dette gikk ganske fint og kjapt. også var det og skjøte resten av Cat 5 kablene, og få ledningene fint inni kanalene og merke dem med tusj. Men så plutselig så fant vi ut at det var jordfeil ett eller annet sted på anlegget, men montøren fant ikke ut hva som var feil, etter lunsj og noen timer med feilsøking så fikset jordfeilen seg selv og alle målingene var riktige. etter mange kanaler var skrudd og målinger gjort, tok vi kvelden.




Dag 7

Nå var det en stall på _____ som sto for tur. Ved denne stallen så var det et hus, SVÆRT hus. Det er må være det største huset jeg har sett! det var 6-7 stuer i huset, spisestue, mellomstue1, mellomstue2, mellomstue3, hovedstue, gjestestue osv.. men det var sykt mye stikkontakter som skulle opp, og alt var åpent, så vi måtte klippe kabel, eller JEG måtte klippe og koble stikk. Etter Blod, svette og vonde knær, var dagen endelig over. Men jeg fikk den samme beskjeden jeg får hverdag "rydd opp alt, kost og samle alt søppel og så er det bare og bære alt utstyret ned i bilen, så setter jeg meg i bilen imens".




Dag 8

Så var det tilbake på . Idag så skulle vi teste at alle nettverks kontaktene funket. Det som var utfordringen var at det var et kontorbygg vi instalerte til og data rommet var en etasje opp. får og si det mildt så var en DEL kontaker og teste, gjett hvem som måtte gå opp og ned, opp og ned, opp og ned hele dagen i 8,5 time? ikke montøren får og si det sånn. men på slutten, når jeg hadde 2 kontakter til så sier han, jeg kunne bare ringt deg når du var oppe, og så kunne jeg sjekket her nede. jeg tenkte bare på at dagen var ferdig og jeg kunne dra hjem, sliten i beina.”

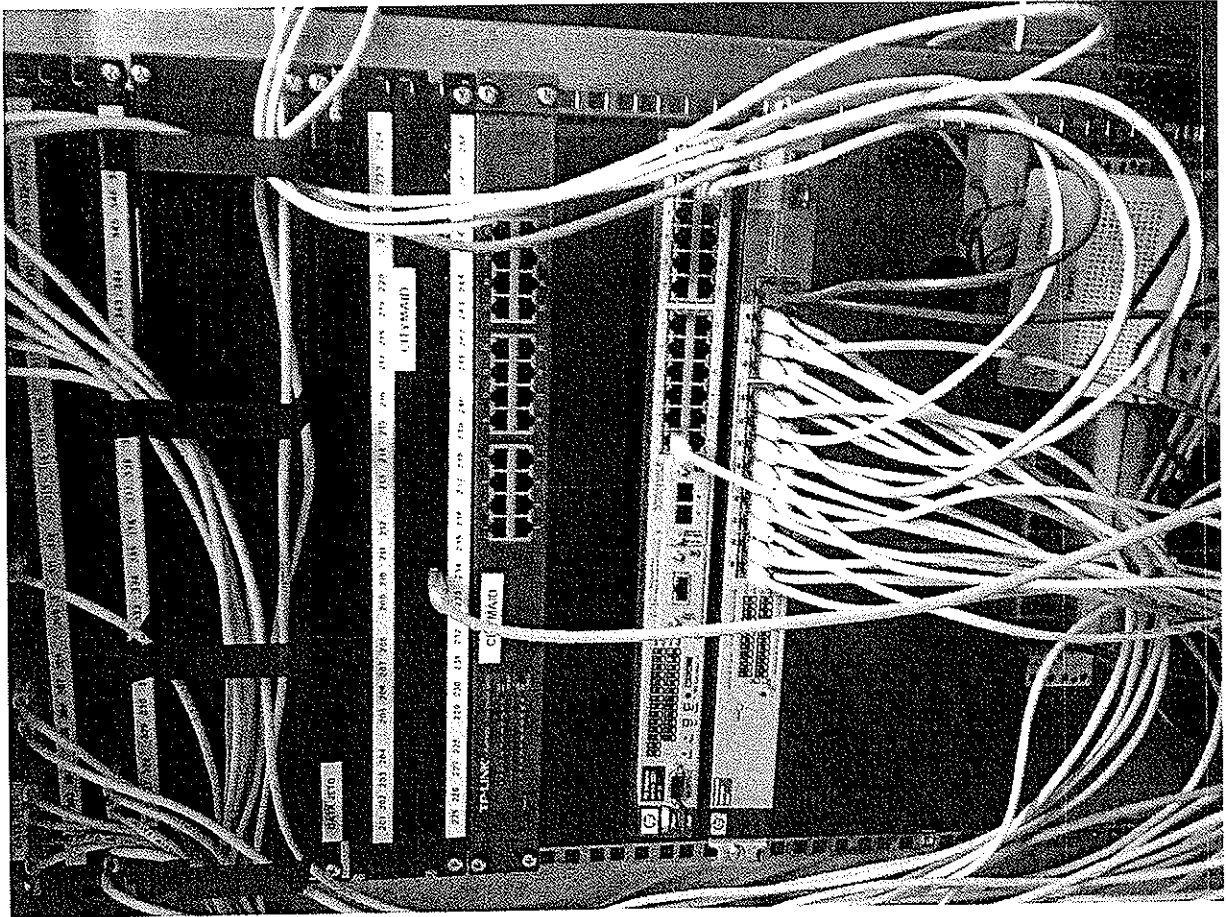

Dag 9

Idag er det nest siste dagen på jobben, idag skulle vi bli ferdig på vi hadde igjen og sette opp 6 dobbel stikk og en komfyr kontakt, en prosjektor. dette gjorde vi ganske enkelt. Han dro alle ledningene og jeg koblet alle stikkontaktene, på slutten så koblet han prosjektoren, mens jeg skulle dele en kanal som hang på veggen, med en sag. jeg greide og lage noen ganske stygge merker i veggen, men så var heldigvis malerne fortsatt der og kunne fikse det. så var det og klippe en cat 5 kabel et lite stykke og koble til den, så var det kvelden.

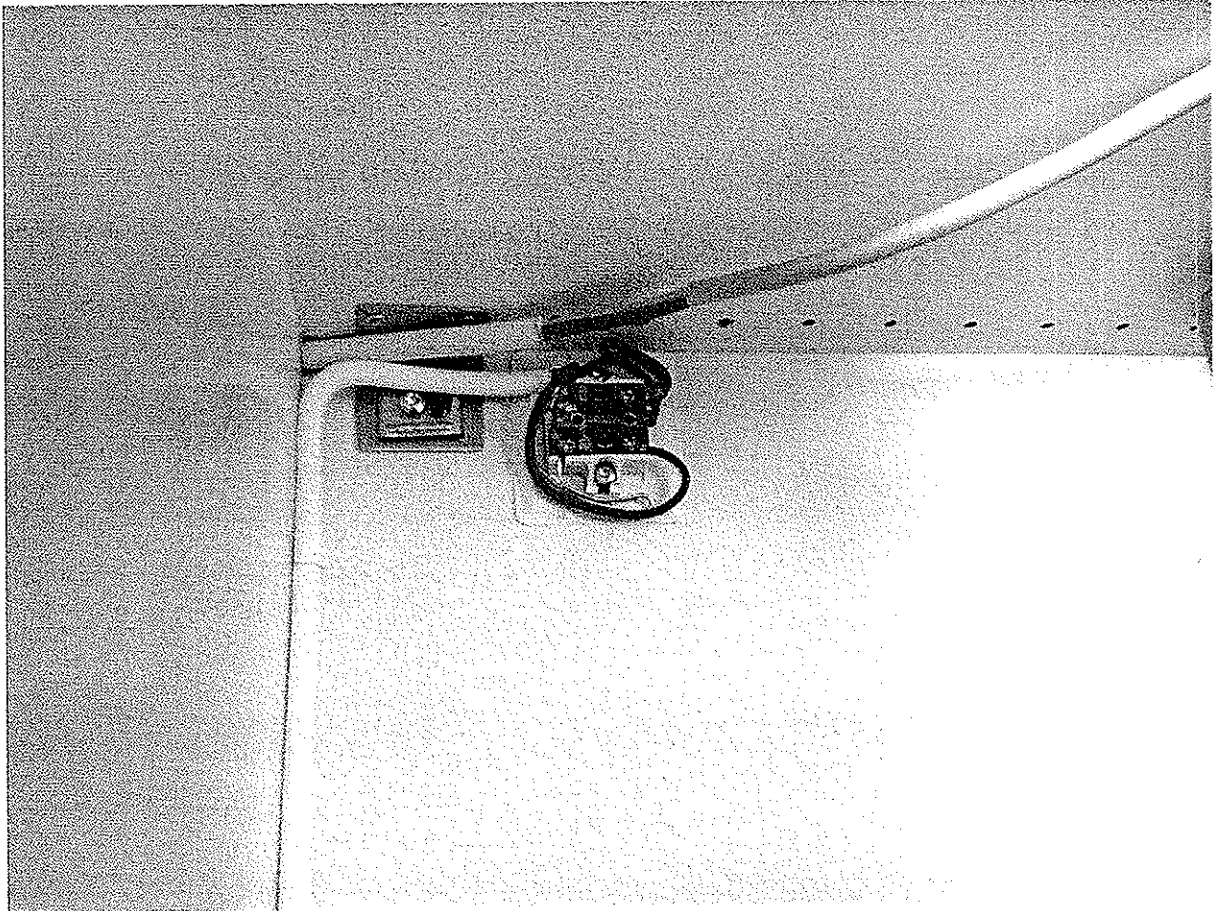

Dag 10

Idag har vi kommet til den siste dagen av utplasserings ukene, så da får vi karakter. vi dro rett på en jobb på i en 2mans bolig og la varmekabler. det var stortsett det vi gjorde hele dagen, legge varmekabler. Jeg fikk ikke legge varmekabler selv, men jeg fikk lime dem. jeg syntes dette var noen vellykket 2 uker, og ser frem til neste gang vi skal på utplasing.

